

受控编号: SDJC/JL-13-91-02

版本号: V1.0

编号: 2491047-2026



蒙 矿管 25 01



检验检测报告

样品名称:	树脂锚固剂
规格型号:	MSCK23/500
委托单位:	
报告日期:	2026年08月26日



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



声 明

- 1、检验检测报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检验检测报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检验检测报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检验检测报告涂改无效；
- 5、对检验检测报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检验检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：中国. 内蒙古自治区. 鄂尔多斯市. 乌兰木伦镇. 神东专业化服务基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2491047-2026

检验检测报告

委托单位			
委托单位地址			
工程名称			
结构部位			
监理单位			
样品接收日期	2026-08-12	委托人 联系方式	
见证人	赵海强	协议号	W1426080580
样品名称	树脂锚固剂	规格型号	MSCK23/500
生产厂家		单样样量	40支
代表数量	3000支	样品来源	/
样品状态	装填饱满，质地柔软，树脂胶泥不分层、不沉淀，固化剂封口严密，无渗漏	委托日期	2026-08-12
检验地点	工程与材料实验室	检验类别	见证委托
检验项目	外观、直径长度、树脂胶泥稠度、固胶比、凝胶时间、抗拔力、单轴抗压强度、热稳定性能		
判定标准	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》		
检验结论	该送检样品经检验，所检项目中单轴抗压强度不符合MT/T 146-2025 《树脂锚杆》标准的规定，其它项目检测结果符合该标准。		
备注	生产日期：2026年7月19日。 有效期：三个月。		

王波
审批：
2026-08-26

张海艳
审核：
张海艳

郝峙
主检：
郝峙



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2491047-2026

检验检测报告

样品名称		树脂锚固剂		检验时间	2026-08-17~2026-08-25		
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
1	H14260811 035	外观尺寸	外观	锚固剂装填饱满，质地柔软，颜色均匀；树脂胶泥不分层、不沉淀，固化剂分布均匀，封口严密，无渗漏。各类型锚固剂的颜色标识符合标准要求。	符合标准	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.1
2			直径 (mm)	22.5~23.5	22.9	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.2
					22.9	合格	
					22.9	合格	
					22.8	合格	
3			长度 (mm)	495~505	502	合格	
					500	合格	
					500	合格	
					504	合格	
4			树脂胶泥稠度 (mm)	≥40	≥40	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.3
		≥40			合格		
		≥40			合格		
		≥40			合格		
5		固胶比 (%)	≥4.0	4.4	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.4	
				5.1	合格		
				5.0	合格		
				5.2	合格		



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2491047-2026

检验检测报告

样品名称		树脂锚固剂		检验时间		2026-08-17~2026-08-25		
序号	化验编号	检验项目		标准限值		检验结果	单项判定	检验方法
6	H14260811 035	凝胶时间 (s)		8~40		22	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.5
						22	合格	
						23	合格	
7		单轴抗压强度 (MPa)		≥60		54	不合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.6
						51	不合格	
						39	不合格	
8		抗拔力 (kN)		≥100		161	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.7 附录A
						152	合格	
						145	合格	
9		热稳定性能	树脂胶泥 稠度 (mm)	≥16		29	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.8
						29	合格	
						28	合格	
以下空白								

附件:

受控编号: SDJC/JL-13-91-02



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.


检验检测报告

编号: 2491047-2026

树脂锚固剂检测图像资料

化验编号: H14260811035-图像说明


检测样品原始状态

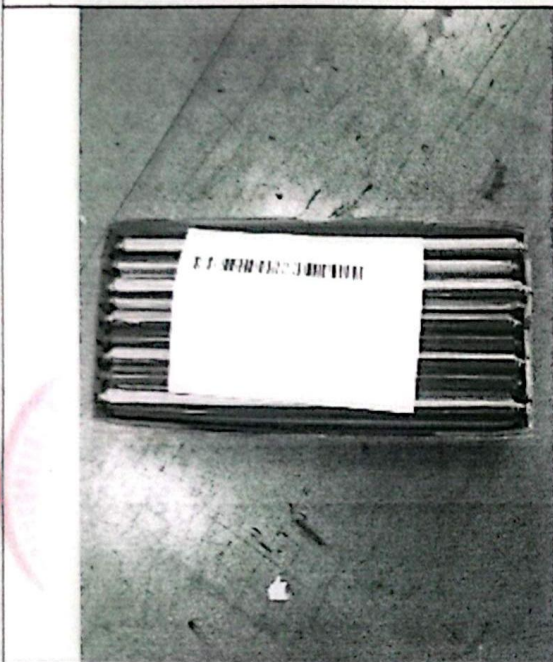

检测样品制完样状态



检测样品检测过程状态

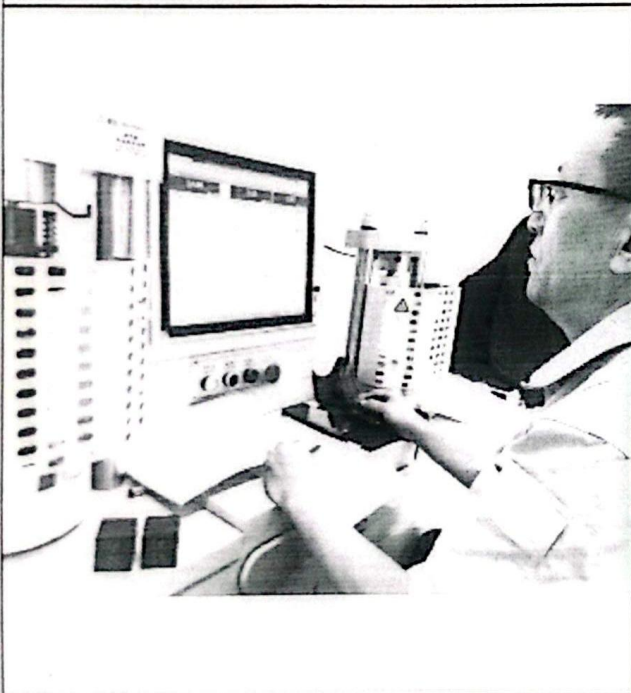

检测样品检测完成状态

