

受控编号: SDJC/JL-13-91-02

版本号: V1.0

编号: 2491055-2026



蒙 矿管 25 01



检验检测报告

样品名称: 树脂锚固剂

规格型号: MSCK23/500

委托单位:

报告日期: 2026年08月26日



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.



声 明

- 1、检验检测报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检验检测报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检验检测报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检验检测报告涂改无效；
- 5、对检验检测报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检验检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：中国.内蒙古自治区.鄂尔多斯市. 乌兰木伦镇. 神东专业化服务基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LTD

编号: 2491055-2026

检 验 检 测 报 告

委托单位	国能榆林能源有限责任公司郭家湾煤矿分公司		
委托单位地址	陕西省榆林市府谷县大昌汗镇石岩塔行政村		
工程名称	国能榆林能源郭家湾煤矿三盘区4-3煤北翼辅助运输大巷		
结构部位	4-3煤北翼辅助运输大巷K500米-K1000米		
监理单位	鄂尔多斯市国能神东监理有限责任公司		
样品接收日期	2026-08-12	委托人 联系方式	祁彦斌/18342845649
见证人	赵海强	协议号	W1426080581
样品名称	树脂锚固剂	规格型号	MSCK23/500
生产厂家	鄂尔多斯市锦誉达商贸有限公司	单样样量	40支
代表数量	3000支	样品来源	/
样品状态	装填饱满,质地柔软,树脂胶泥不分层、不沉淀,固化剂封口严密,无渗漏	委托日期	2026-08-12
检验地点	工程与材料实验室	检验类别	见证委托
检验项目	外观、直径长度、树脂胶泥稠度、固胶比、凝胶时间、抗拔力、单轴抗压强度、热稳定性能		
判定标准	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》		
检验结论	该送检样品经检验,所检项目中单轴抗压强度不符合MT/T 146-2025 《树脂锚杆》标准的规定,其它项目检测结果符合该标准。		
备注	生产日期: 2026-7-19 保质期: 3个月		

审批: 王波

2026-08-26

审核: 张海艳

张海燕

主检: 郝峙

郝峙



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2491055-2026

检验检测报告

样品名称		树脂锚固剂		检验时间	2026-08-17~2026-08-25		
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
1	H14260811 039	外观尺寸	外观	锚固剂装填饱满，质地柔软，颜色均匀；树脂胶泥不分层、不沉淀，固化剂分布均匀，封口严密，无渗漏。各类型锚固剂的颜色标识符合标准要求。	符合标准	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.1
2			直径 (mm)	22.5~23.5	22.7	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.2
					22.6	合格	
					22.7	合格	
					22.8	合格	
3			长度 (mm)	495~505	505	合格	
					503	合格	
					502	合格	
					502	合格	
4		树脂胶泥稠度 (mm)	≥40	≥40	≥40	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.3
					≥40	合格	
					≥40	合格	
					≥40	合格	
5		固胶比 (%)	≥4.0	≥4.0	5.1	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.4
					5.6	合格	
					5.0	合格	
					6.3	合格	



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

编号: 2491055-2026

检 验 检 测 报 告

样品名称		树脂锚固剂		检验时间	2026-08-17~2026-08-25		
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
6	H14260811 039	凝胶时间 (s)		8~40	23	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.5
					22	合格	
					21	合格	
7		单轴抗压强度 (MPa)		≥60	55	不合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.6
					26	不合格	
					27	不合格	
8		抗拔力 (kN)		≥100	155	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.7 附录A
					136	合格	
					136	合格	
9	热稳定性能	树脂胶泥 稠度 (mm)	≥16	29	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.8	
				30	合格		
				28	合格		
以下空白							

附件:

受控编号: SDJC/JL-13-91-02



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

检 验 检 测 报 告

编号: 2491055-2026


树脂锚固剂检测图像资料

化验编号: H14260811039-图像说明

检测样品原始状态



检测样品制完样状态

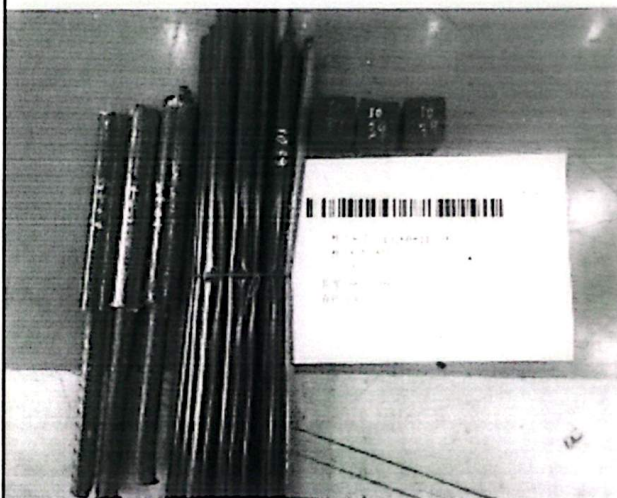

检测样品检测过程状态



检测样品检测完成状态

