

受控编号：SDJC/JL-13-91-02

版本号：V1.0

编号：2506796-2026



蒙 矿管 25 01



检验检测报告



样品名称：	树脂锚固剂
规格型号：	MSCKa32/500
委托单位：	布尔台煤矿
报告日期：	2026年09月18日



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.



声 明

- 1、检验检测报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检验检测报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检验检测报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检验检测报告涂改无效；
- 5、对检验检测报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检验检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：中国.内蒙古自治区.鄂尔多斯市. 乌兰木伦镇. 神东专业化服务基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2506796-2026

检验检测报告

委托单位	布尔台煤矿		
委托单位地址			
工程名称	布尔台煤矿三盘区12上辅运大巷延伸工程（2026）		
结构部位	巷道顶部		
监理单位	鄂尔多斯市国能神东监理有限责任公司		
样品接收日期	2026-08-28	委托人 联系方式	
见证人	杨万元	协议号	W1426080743
样品名称	树脂锚固剂	规格型号	MSCKa32/500
生产厂家		单样样量	40支
代表数量	3000支	样品来源	/
样品状态	装填饱满，质地柔软，树脂胶泥不分层、不沉淀，固化剂封口严密，无渗漏	委托日期	2026-08-28
检验地点	工程与材料实验室	检验类别	见证委托
检验项目	外观、直径长度、树脂胶泥稠度、固胶比、凝胶时间、抗拔力、单轴抗压强度、热稳定性能		
判定标准	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》		
检验结论	该送检样品经检测检验，所检项目单轴抗压强度不符合MT/T 146-2025 《树脂锚杆》标准的规定，其他项目符合该标准，综合判定该树脂锚固剂不合格。		
备注	生产日期：2026年8月24日 保质期：三个月		

王波
审批：
2026-09-18

张海艳
审核：
张海艳

郭小丽
主检：
郭小丽



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2506796-2026

检验检测报告

样品名称		树脂锚固剂		检验时间	2026-09-08~2026-09-18		
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
1	H14260817 387	外观尺寸	外观	锚固剂装填饱满，质地柔软，颜色均匀；树脂胶泥不分层、不沉淀，固化剂分布均匀，封口严密，无渗漏，各类型锚固剂的颜色标识符合标准要求。	符合标准	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.1
2			直径 (mm)	31.5~32.5	31.6	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.2
					31.6	合格	
					31.7	合格	
					31.6	合格	
3			长度 (mm)	495~505	504	合格	
					503	合格	
					503	合格	
					504	合格	
4		树脂胶泥稠度 (mm)	 ≥40	≥40	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.3	
				≥40	合格		
				≥40	合格		
				≥40	合格		
5		固胶比 (%)	≥4.0	6.9	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.4	
				6.9	合格		
				7.0	合格		
				7.0	合格		



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2506796-2026

检 验 检 测 报 告

样品名称		树脂锚固剂		检验时间	2026-09-08~2026-09-18		
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
6	H14260817 387	凝胶时间 (s)		8~40	22	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6. 2. 5
					20	合格	
					21	合格	
7		单轴抗压强度 (MPa)		≥60	55	不合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6. 2. 6
					33	不合格	
					35	不合格	
8		抗拔力 (kN)		≥100	135	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6. 2. 7 附录A
					131	合格	
					136	合格	
9	热稳定性	树脂胶泥稠度 (mm)	≥16	34	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6. 2. 8	
				35	合格		
				34	合格		
以下空白							



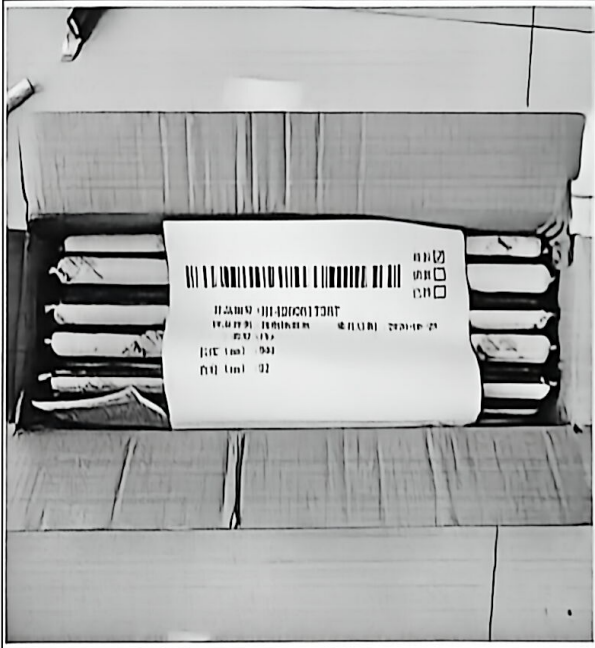
国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

检验检测报告

编号：2506796-2026

树脂锚固剂检测图像资料

化验编号：H14260817387-图像说明	
检测样品原始状态	检测样品制完样状态
	
检测样品检测过程状态	检测样品检测完成状态
	
